



दोर्दी-१ जलविद्युत खबर

भाद्र २०७६, अंक ३४

आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था


दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको Headworks निर्माण कार्यअन्तर्गत हाल Undersluice, Gravel trap, Approach canal को निर्माण कार्य भईरहेको छ । River Structures को ५७.०% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने Gravel trap, Approach canal Intake & Desander Intake निर्माण कार्यको प्रगति ६६ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस आयोजनाको विद्युतगृह र Penstock Line Civil Work को भौतिक निर्माण कार्य पनि २१.८८% पुगेको छ ।

त्यसैगरी, Penstock Pipe को निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बटवलस्थित मेगा हाइड्रो एण्ड इन्जीनियरिङको फ्याक्ट्रीमा Penstock को ४०० मिटर पाइप रोलीड भइसकेको छ भने तिन वटा बेन्ड Assembly भई र १५० मिटर Penstock Pipe आयोजना स्थलमा पुगिसकेको छ । हाल पेनस्टक पाइपको Bifurcation र Gate Leaf को निर्माण कार्य सकिएको छ र आयोजना क्षेत्रमा ढुवानी क्रममा रहेको छ ।



आयोजनाका प्राविधिकबाट सुरङको निरिक्षण गरिदै ।

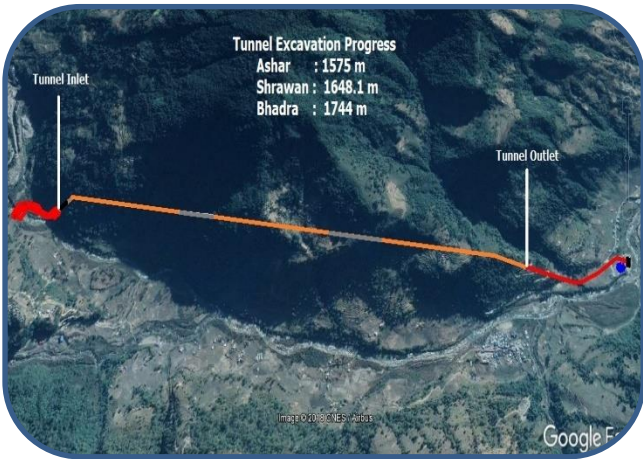

सुरुङ खन्ने कार्यको मासिक प्रगति ।

सुरुङ्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत Inlet तर्फबाट ९८२.० मिटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सकिएको छ भने Outlet तर्फबाट ७६२.० मिटर सुरुङ्ग निर्माण भइसकेको छ । यसरी, आयोजनाले श्रावण मसान्त सम्म Inlet र Outlet तर्फ गरी कुल १७४४ मिटर सुरुङ्ग निर्माण गरिसकेको छ । साथै, Ashwin मसान्त सम्ममा Inlet/Outlet दुवै तर्फबाट गरी सुरुङ्गको लम्बाई १९०० मिटर पुऱ्याउने लक्ष्यका साथ कार्य अघि बढिरहेको छ । Bhadra महिनाको अन्त्यसम्म सुरुङ्ग निर्माण को कार्यको प्रगति ५६.३३% भइसकेको छ ।

यस आयोजनाको Electromechanical कार्यको Contractor B. Fouress (P) Ltd. ले विद्युतगृहको आवश्यक Design कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । साथै, आयोजनाको टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर लगायत सम्पूर्ण Electromechanical सामग्रीको निर्माण भारतस्थित फ्याक्ट्रीहरूमा तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । आगामी कार्तिक महिनामा उक्त सामग्रीहरूको ढुवानी समेत सुरु हुनेछ ।

विद्युतगृहको दुवै Unit को Tailrace Gate Frame को जडान कार्य पनि सकी विद्युतगृहको Raft floor Foundation को निर्माण कार्य सकिएको छ । विद्युतगृहको Beam र Pillar निर्माण कार्य पनि अघि बढिसकेको छ । निकट भविष्यमा नै विद्युत गृहमा EOT Crane जडान गर्ने लक्ष्य कम्पनीको रहेको छ ।



इन्टेक गेट बेसको डन्डि बाँधने कार्य गरिँदै ।

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको किर्तिपुर सबस्टेसनसम्म लैजाने प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनी Cosmic Electrical Engineering Associates Pvt. Ltd. ले प्रसारण लाइनको Survey र Geotechnical Investigation कार्य सकी Design कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाहरुको खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । टावरको फाउन्डेसन निर्माण कार्य आगामी कार्तिक महिनावट सुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ ।

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्न आवश्यक नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको किर्तिपुर सबस्टेसनको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसका साथै टावरहरुको निर्माणका लागि फाउन्डेसन निर्माण कार्य पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।



आयोजनाको अन्डरश्लुइसको निर्माण अघि बढाईँदै ।



आयोजनाको विद्युतगृहको निर्माण कार्यको एक भलक ।



सम्पादक : कृतिका भट्ट
दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोन न: ९७७ - ०१ ४२३२७५०
वेबसाइट: www.dordikhola.com.np
